



**COOPERATIVE 4
FEMALE
EMPOWERMENT
IN MADAGASCAR**

**NEWS LETTER NR 2
Ottobre 2022**

Il progetto **COOPERATIVE 4 FEMALE EMPOWERMENT IN MADAGASCAR** sta procedendo in linea con gli obiettivi prefissati nonostante alcune avversità dovute alla pandemia da **Covid 19**, alla situazione climatica del periodo Febbraio-Marzo e ad una epidemia di avaria nella regione.

Alla fine di Settembre 2022 sono state realizzate il 70% delle attività programmate con un impegno di spesa pari a 68% del budget previsto.

Descrizione del progetto

Il progetto **COOPERATIVE 4 FEMALE EMPOWERMENT IN MADAGASCAR** si realizza nel villaggio di **Ambalanjanakomby**, a nord della capitale, e prevede due fasi, indipendenti fra loro, che saranno realizzate in tempi successivi in base ai finanziamenti che si otterranno.


Attualmente è in corso di realizzazione la **prima fase** del progetto che è stata approvata e finanziata nel mese di dicembre 2021 dalla **P&G Foundation** per un importo di € 13.800.

Il progetto prevede il potenziamento di allevamenti di animali da cortile ed ha l'obiettivo di realizzare entro il 2022 **un allevamento di polli** da carne che andrà ad integrare quello già esistente di galline ovaiole realizzato nel 2016/2017.

Il progetto assume una valenza particolarmente importante per l'intera popolazione del villaggio che in questi primi 9 mesi del 2022 ha visto peggiorare la già grave situazione economica a causa non solo della pandemia del **COVID**, ma anche a causa della **siccità** e di **eventi atmosferici** particolarmente devastanti.

FASI OPERATIVE

- Costituzione di una **cooperativa** (deve comprendere almeno il 60% del totale di donne);
- Acquisizione in comodato d'uso gratuito di un terreno (200 mq.) per la realizzazione di un **pollaio (febbraio-giugno)**;
- Realizzazione di un **pollaio in muratura** delle dimensioni di 50 mq: coperti, con annesso uno spazio all'aperto di 150 mq. che dovrà essere recintato;
- Acquisto **materiali edili** (legname, mattoni, calce, cemento, foglie di palma, ecc.);
- Acquisto **mangimi** (a base di mais, avena, integratori minerali, ecc.);
- Acquisto di **100 pulcini** che dovranno essere allevati per 5 mesi e successivamente rivenduti;
- Realizzazione di un **pozzo** per soddisfare i fabbisogni idrici dell'allevamento;
- Realizzazione di **corsi di formazione** sulle tecniche di allevamento e sanitarie rivolti ai soci della cooperativa;
- Acquisto attrezzature varie e vestiario da lavoro per tutti i soci della cooperativa;
- Vendita polli al vicino mercato di **Maevatanana**;
- Missione in **Madagascar** di due rappresentanti Seniores facenti parte del team di progetto

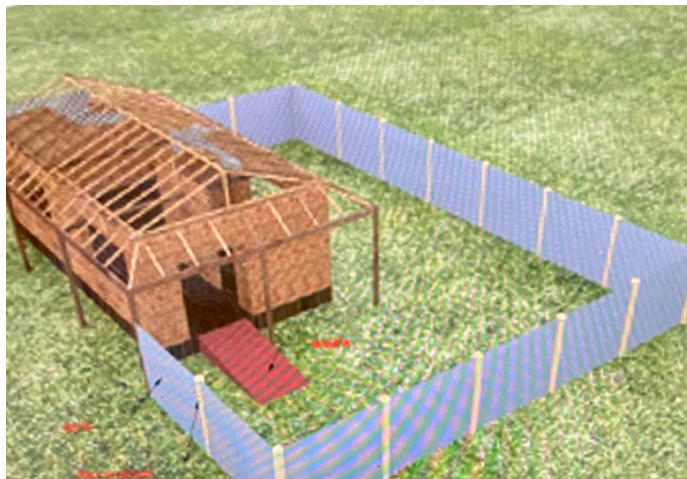

progetto pollaio e recinto



costruzione pollaio



costruzione pollaio



pollaio



costruzione pozzo

Attività realizzate

Febbraio: è stata costituita una **cooperativa** denominata “**Mendrika**”, nome che nella lingua Malgascia vuole dire “meritevole”. Successivamente tale cooperativa ha acquisito in comodato d’uso gratuito per 10 anni i 200 mq. di terreno previsti per la realizzazione del pollaio.

Giugno: è terminata la costruzione del **pollaio di 50 mq.** più 150 mq. di spazio all’aperto recintato per consentire il razzolamento dei polli. Una volta finito il pollaio sono stati acquistati sia i **mangimi** che i **100 pulcini** previsti. Subito dopo, i tecnici del locale Ministero dell’Agricoltura hanno iniziato i corsi di formazione per gli addetti della cooperativa, sia sulle tecniche di allevamento che di profilassi sanitaria.

Giugno - luglio - agosto: In seguito all’epidemia aviaria iniziata a giugno è stata effettuata la disinfestazione operata dai membri della cooperativa sotto la direzione dei tecnici del **Ministero dell’Agricoltura**.

Formazione: i corsi si sono svolti a **giugno, luglio e agosto** tuttavia, in seguito alla epidemia aviaria (che ha causato la morte di circa il 30% dei pulcini, poi rimpiazzati), si è deciso di intensificare la presenza dei tecnici che forniranno assistenza tecnica all’allevamento fino alla fine del primo ciclo di produzione assicurando la loro presenza con cadenza settimanale.

Settembre: è terminata la realizzazione del **pozzo** necessario per l’approvvigionamento idrico dell’allevamento.

Ottobre: attualmente la crescita dei polli procede regolarmente e se ne prevede la vendita nella seconda metà di novembre. Inoltre entro l’inizio di novembre è previsto l’**acquisto di altri 100 pulcini** che saranno allevati e venduti nei primi mesi del 2023.



pozzo in funzione



formazione soci cooperativa in aula



pulcini inizio allevamento



pollastri di circa 3 mesi

Criticità incontrate

Il primo semestre di quest'anno è stato caratterizzato da eventi sanitari e climatici particolarmente sfavorevoli, che inizialmente hanno ritardato le fasi di avvio del progetto.

In particolare si è avuta una recrudescenza della pandemia del Covid e, nei mesi di febbraio e marzo, la presenza di **violenti nubifragi** che hanno devastato intere zone del Madagascar, hanno reso le vie di comunicazione, già in pessime condizioni, quasi impraticabili.

La **pandemia Covid** ha rallentato notevolmente la **produzione di materiali edili** (cemento e laterizi), degli **allevamenti aviari** (polli e pulcini) e dei **mangimi**, che per i primi mesi dell'anno sono risultati di difficile reperibilità. Le precarie condizioni della rete stradale nazionale, aggravate dai nubifragi, strade spesso impraticabili, hanno contribuito a ritardare la fase iniziale del progetto.

Infine l'**epidemia aviaria** nella regione ha comportato la perdita di parte dei pulcini acquistati e quindi ulteriori ritardi nella realizzazione della fase finale di accrescimento e vendita dei polli



membri della Cooperativa con figli

Obiettivi raggiunti

Malgrado tali **criticità**, il progetto ha continuato a realizzarsi con regolarità e i ritardi iniziali sono stati quasi del tutto recuperati.

Inoltre è stato raggiunto uno degli obiettivi principali del progetto:

- **stimolare una reazione positiva e propositiva nei soci della cooperativa.**

Infatti si è riscontrato un **atteggiamento costruttivo** da parte dei soci che si sono impegnati a risolvere i problemi derivanti dalle avversità, facendo squadra e proponendo o prendendo iniziative volte alla soluzione dei problemi.

Questo risultato è stato enormemente gratificante perché è la strada vincente per porre le basi di un solido e duraturo riscatto sociale ed economico della popolazione del villaggio.

Lo studio di casi analoghi insegna infatti che un atteggiamento costruttivo e reattivo rispetto alle avversità è da sempre il presupposto per evitare il precoce fallimento dei progetti in queste zone disagiate dell'Africa.

